

様式-1-② (記載例)

日本下水道事業団

契約職 氏 名 殿
○○○○

提出年月日	令和 年 月 日	契約変更日	令和 年 月 日
工 期	自 令和 年 月 日	工 期	自 令和 年 月 日
元	至 令和 年 月 日	改	至 令和 年 月 日

工事請負契約書第3条の規定に基づき工程表を提出します。

工 事 工 程 表 (第 回変更)

受注者 住 所
氏 名

印

工事名																摘 要	
工 種	種 別	単 位	数 量	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月		月
(記入例)																	
管路施工																	
	φ1,000mm 管 布 施 工																
	マンホール設置工																

- (注) 1 提出年月日は契約変更日から14日以内とする。
 2 バーチャートによる。
 3 工期を変更した場合は で示す。
 4 原則として工事設計書の様式3 本工事費内訳書に記載された工種、種別に従って記入する。
 5 (回) には、変更契約書の回数を記入する。
 6 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。
 7 受注者は、代表者又は代表者から委任を受けている者とする。

様式-13 (記載例)


実 施 工 程 表

提出年月日	令和 年 月 日
工 期	自 令和 年 月 日
	至 令和 年 月 日

工事名	
-----	--

受 注 者
 現場代理人
 氏 名

1 土木、建築工事（建築設備も含む）

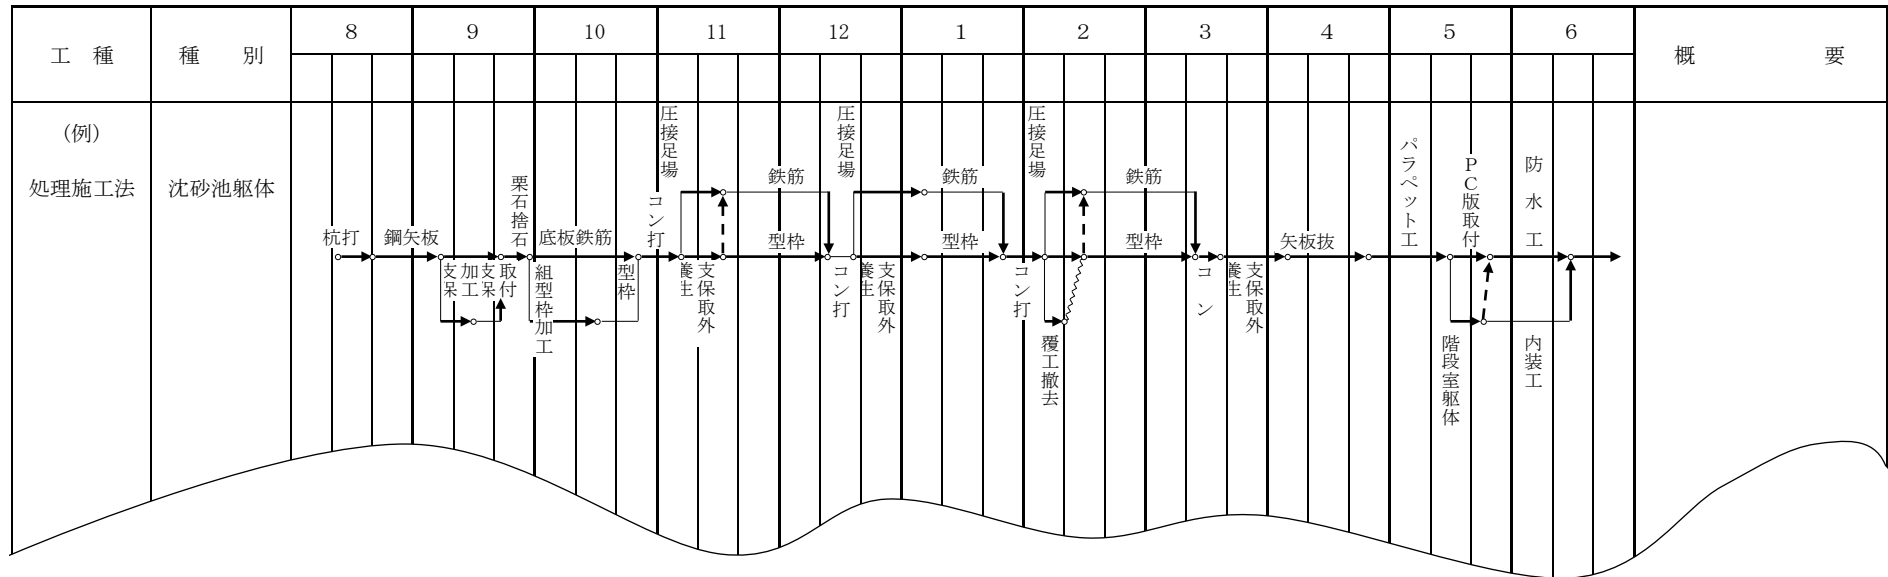


- (注) 1 バーチャートによる工程表でもよい。
 2 変更の場合の表示は工事工程表に準ずる。
 3 JS版工事情報共有システム (JS-INSPIRE) を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。

令和 5年 10月度		工事件名: ○○浄化センター建設工事																															計画No. 3		計画報告日 令和〇年03月24日																						
<月>		9月															10月															11月			受注者 株式会社○○建設																						
<日>		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	現場代理人 ○○ ○○																				
<曜日>		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																					
<天気>晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※																																																									
仮設工事																	東外部足場組立															西外部足場組立			南外部足場組立		北外部足場組立																				
3階	[A工区] A通 2-3間																																																	仮設間仕切		既存壁撤去					
	[B工区] B通 4-5間																																																								
2階	[A工区] A通 2-3間																仮設間仕切															既存壁撤去			アンカー		配筋			型枠		CON打															
	[B工区] B通 4-5間																																																	アンカー		仮設間仕切			既存壁撤去		
1階	[A工区] A通 2-3間	アンカー															配筋			型枠		CON打																					脱型		グラウト型枠・打設												
	[B工区] B通 4-5間																仮設間仕切			既存壁撤去		アンカー			配筋																					脱型		型枠			CON打						
外構		植栽移植																																																							
電気設備工事																	機器取り外し																																	機器取り外し							
機械設備工事																	機器取り外し																																	機器取り外し							
補足図面 (平面図)																																																									
【現場の閉所】		計画		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉		閉																							
【委託団体立会】																	事務室立入																		事務室立入																						
【休日・夜間作業】																	8:30~16:00																		8:30~16:00																						
【騒音・振動】		アンカー															CON打			アンカー		CON打			アンカー															CON打		アンカー															
【一工程の施工確認(受入検査等)】		右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。 主任技術者 ○○ ○○ ★: 現場立会 ●: 書面確認																															<確認資料等>																								
【監督職員等の検査・立会請求】		配筋検査															配筋検査			配筋検査		配筋検査																																			
【工事材料搬入】		<ul style="list-style-type: none"> ●: 搬入日 ★: 検査日 																															工事材料搬入一覧表 ・有 ・無																								
【施工計画書・報告書・施工図等】		2F躯体図															3F躯体図			1F平面詳細図		塗装施工計画															塗装施工計画																				
【主要行事】		安全大会															安全衛生協議会			安全衛生協議会															安全衛生協議会																						

【進捗状況(累計%)】		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">10月</th> <th colspan="2">11月</th> </tr> <tr> <td>予定</td> <td>実施</td> <td>予定</td> <td>実施</td> </tr> <tr> <td>12.0%</td> <td></td> <td>23.4%</td> <td>—</td> </tr> </table>				10月		11月		予定	実施	予定	実施	12.0%		23.4%	—		
10月		11月																	
予定	実施	予定	実施																
12.0%		23.4%	—																
【週休2日】		現場閉所の報告 (累計)		<table border="1"> <tr> <td>現場閉所の日数</td> <td>9</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>対象期間の日数</td> <td>31</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>現場閉所率</td> <td>29.0</td> <td>%</td> </tr> </table>		現場閉所の日数	9	日	対象期間の日数	31	日	現場閉所率	29.0	%	注) 累計は、現場着工から当該月末までとする。				
現場閉所の日数	9	日																	
対象期間の日数	31	日																	
現場閉所率	29.0	%																	
【備考欄】		凡例		<ul style="list-style-type: none"> — 計画工程 ○ — 実施工程 ● — 修正・追加工程 ○ 															

		9月							10月							11月																																																												
<月>		9月							10月							11月																																																												
<日>		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																								
<曜日>		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																								
<天気>		晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※																																																																										
仮設工事										東外部足場組立											西外部足場組立																			南外部足場組立																								北外部足場組立												
3階	[A工区] A通 2-3間																																																																											
	[B工区] B通 4-5間																																																																											
2階	[A工区] A通 2-3間																																																																											
	[B工区] B通 4-5間																																																																											
1階	[A工区] A通 2-3間																																																																											
	[B工区] B通 4-5間																																																																											
外構																																																																												
電気設備工事																																																																												
機械設備工事																																																																												

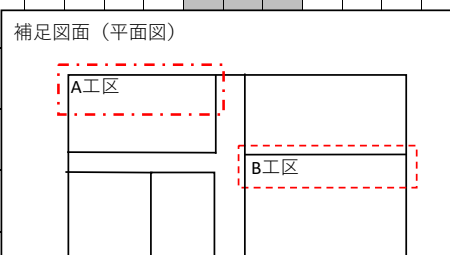

アンカー作業の遅延により
21日に休日作業実施

21日の休日作業は19日に報告し監督承諾済み

<確認資料等>
アンカー引張試験報告書
配筋検査報告書

工事材料搬入一覧表
・有
・無

【進捗状況(累計%)】			
10月		11月	
予定	実施	予定	実施
12.0%		23.4%	—

【週休2日】		
現場閉鎖の日数		日
対象期間の日数		日
現場閉鎖率	#DIV/0!	%

注) 累計は、現場着工から当該月末までとする。

- 凡例
- 計画工程 ○
 - 実施工程 ●
 - 修正・追加工程 ○
